Wegenis- en rioleringswerken Beerse

BUSSELEN

Bewonersvergadering Start uitvoering

25 maart 2019

INHOUD

1. Actoren
2. Projectgebied
3. Bestaande toestand
4. Ontwerp
5. Uitvoering
6. Afkoppelingen
7. Vragen

ACTOREN

Bouwheer	Gemeentebestuur Beerse
Mede-bouwheer	Fluvius
Studiebureau	Antea Group
Aannemer	AGBb

PROJECTGEBIED

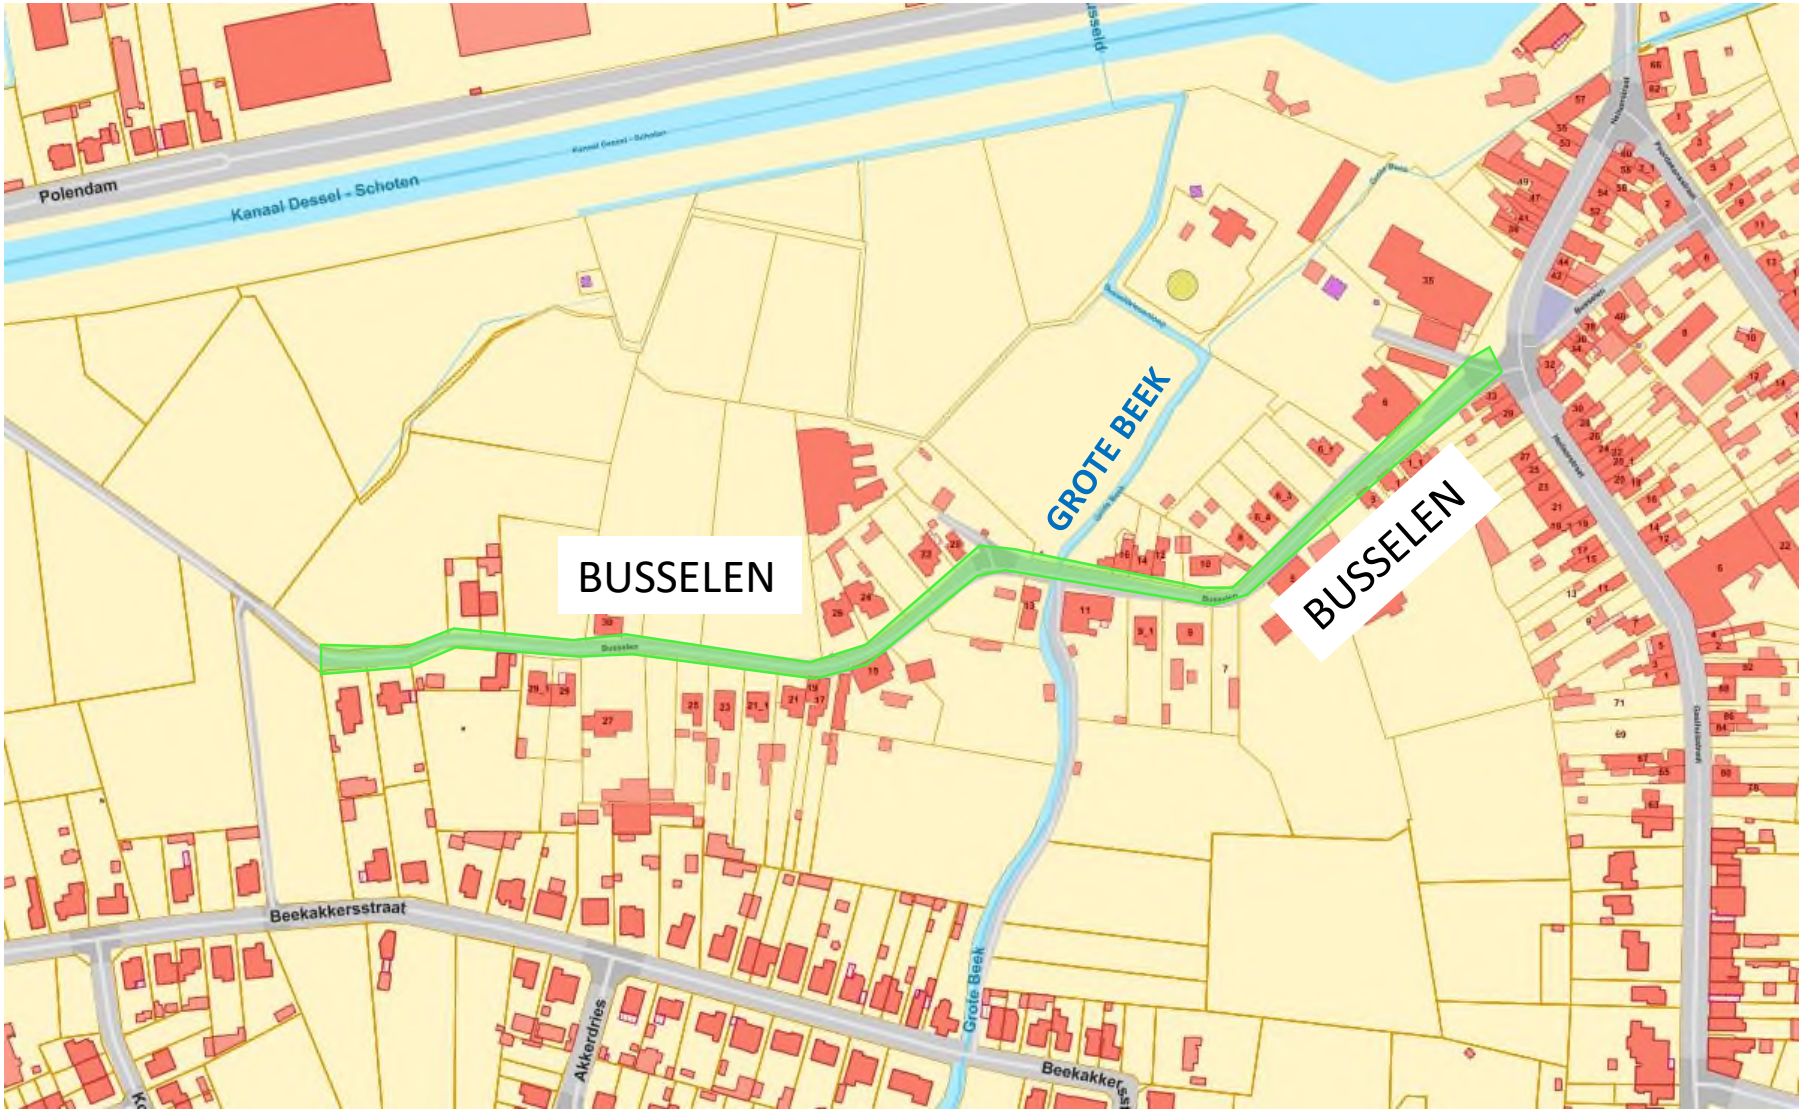

BESTAANDE TOESTAND - Riolering

- Gemengd rioolstelsel aanwezig
  = 1 buis voor afvalwater en regenwater
- Afwatering via bermen richting Grote Beek

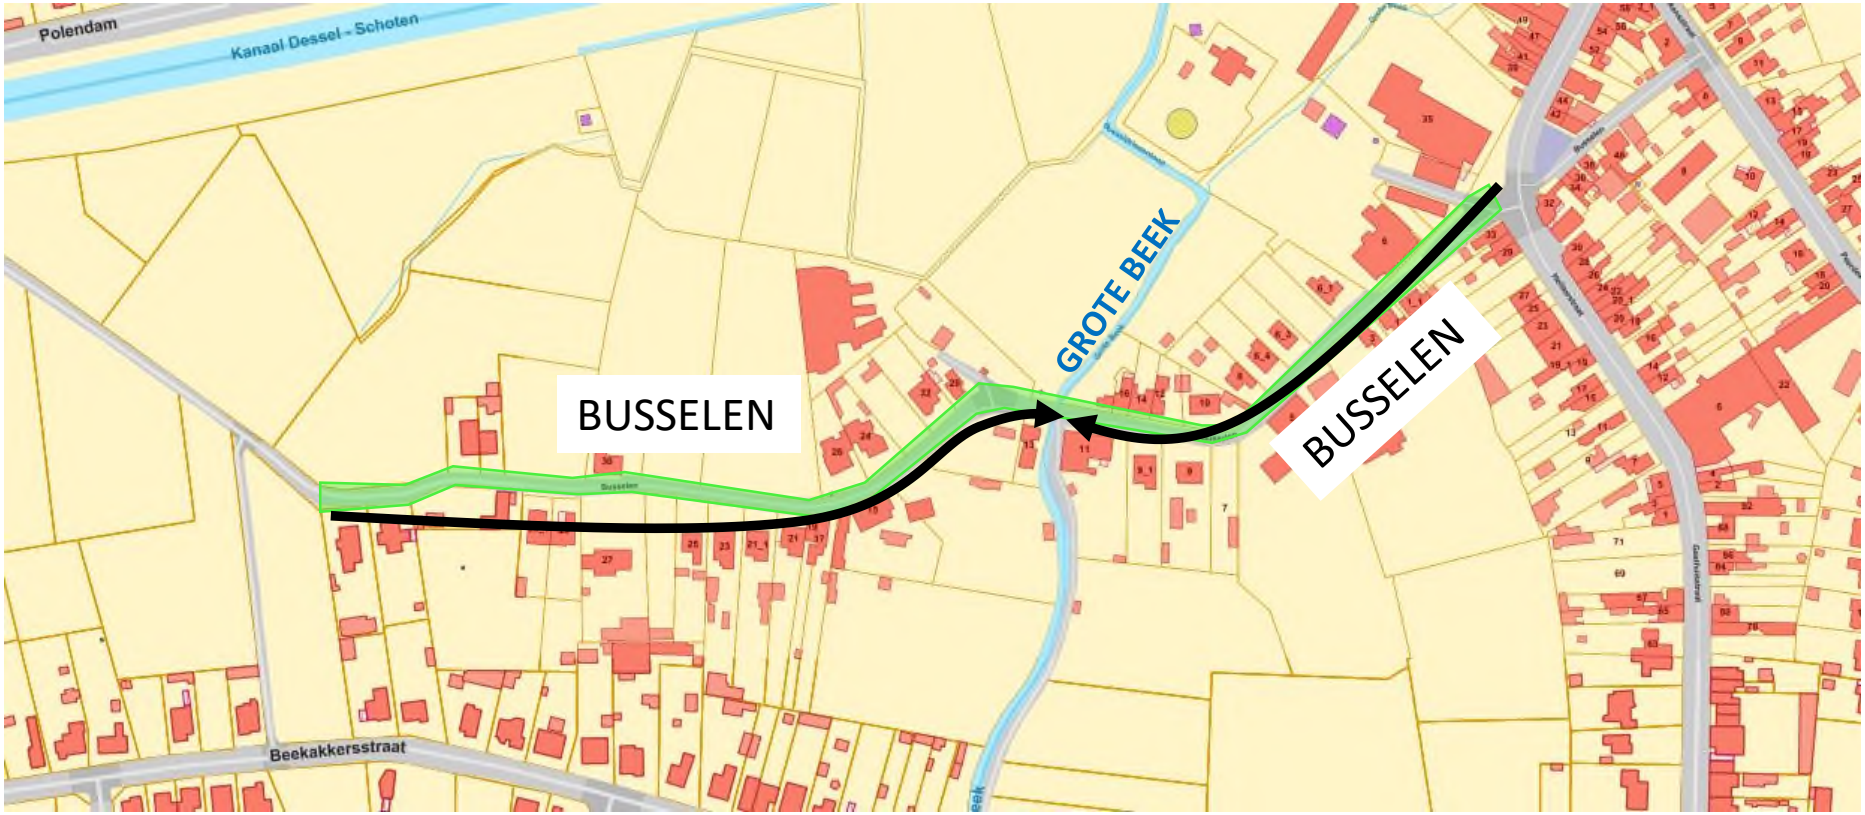

RIOLERING - ONTWERPCRITERIA

Gescheiden riolering

afvalwater en regenwater

↓ ↓

DWA RWA

↓ ↓

Heilaarstraat waterloop

↓

RWZI

ONTWERP - RIOLERING

- Nieuwe DWA – leiding
- Centraal pompstation met persleiding naar Heilaarstraat
- Noodoverlaat bij pompuitval naar Grote Beek
- RWA in bestaande grachten/buizen

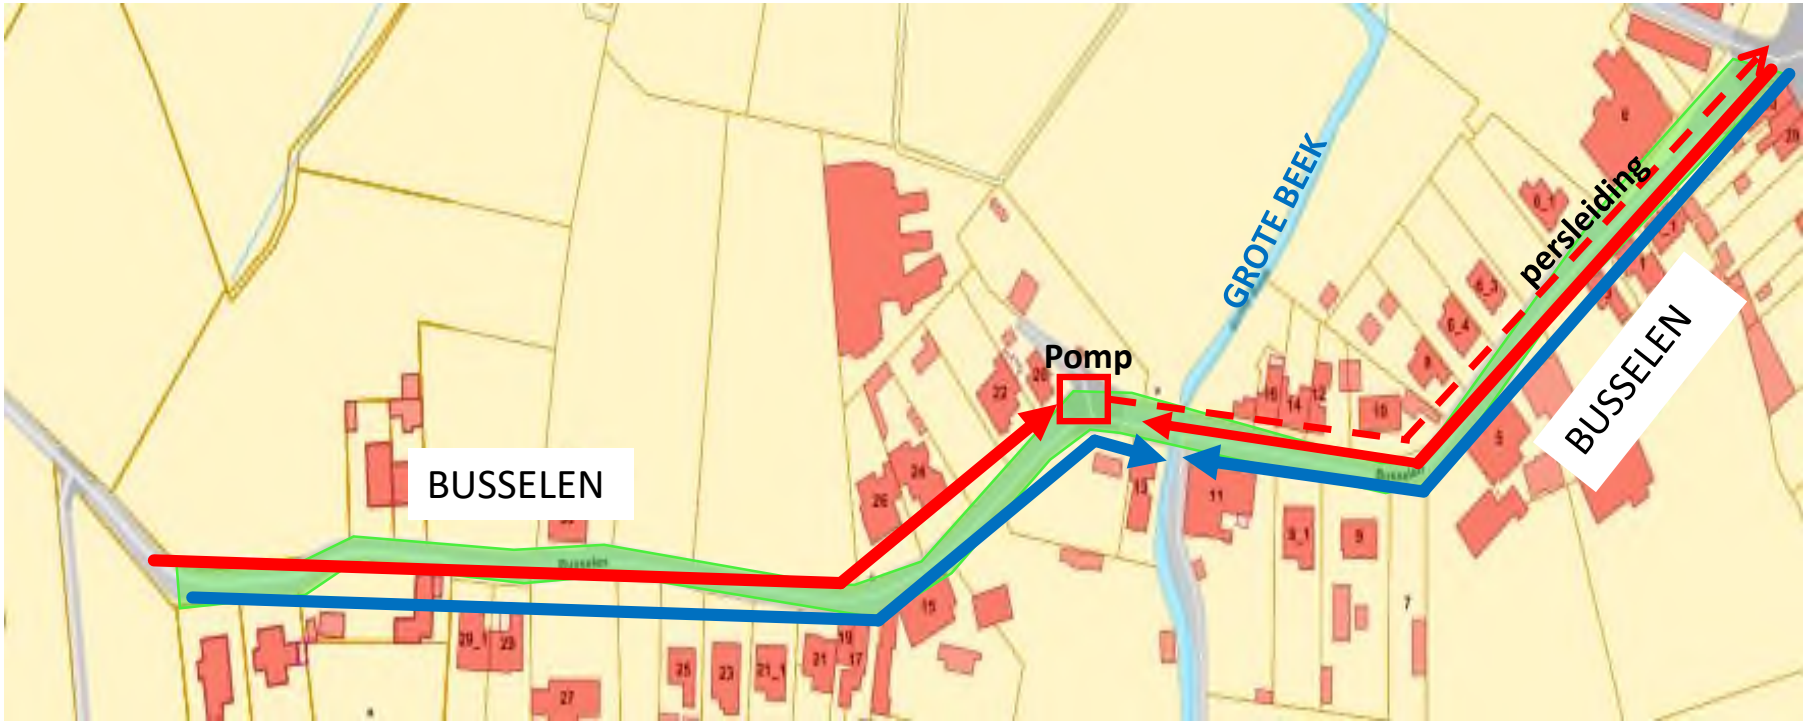

TIMING

Globale projectplanning

15 april 2019 Start der werken Busselen

Fase 1: ten westen van Pompstation

Fase 2: ten oosten van Pompstation

Augustus 2019 Einde werken

De werken praktisch

De werken praktisch

Opbraak bestaande verhardingen

De werken praktisch

Aanleg riolering

De werken praktisch

Maken huisaansluitingen

De werken praktisch

Aanleg rijweg

Minder - Hinder

VUILNISOPHALING

- Door bewoners naar één van de twee verzamelpunten te brengen

PARKEREN TIJDENS DE WERKEN

- Parking Cultureel centrum
- Tweede parking en toegangweg weiland in onderzoek

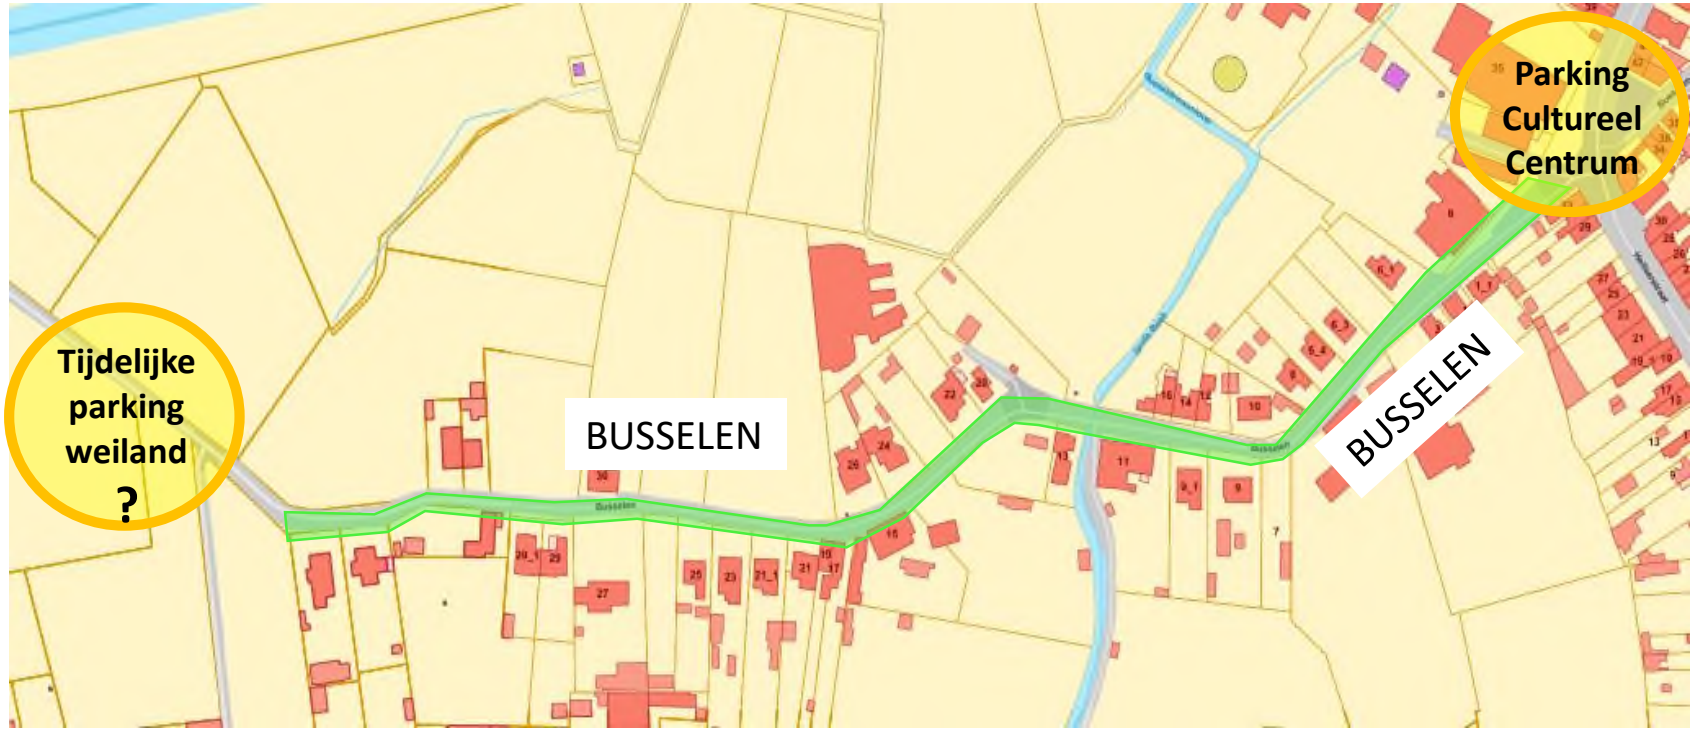

Minder-Hinder

BEREIKBAARHEID WONINGEN

- Te voet steeds bereikbaar
- Minder-hindersteenslag in kader van bereiken woning/oprit met voertuig BUITEN de werkuren
- In sommige fasen van de werken oprit niet bereikbaar (vb aanleg riolering tet hoogte van woning, storten beton)
- Indien woning bereikbaar dient te zijn -> aannemer te contacteren

Contact/locatie werfkeet

Kaart met locatie werfkeet toe te voegen indien gekend, anders slide te verwijderen

Veiligheid op de werf

Veiligheid vanuit aannemer

- Veiligheid en gezondheidsplan met specifieke maatregelen

Veiligheid vanuit bewoners

- Alertheid bij betreden werf (geen oortjes, geen gsm, …)
- Signalisatie en afsluitingen respecteren/niet verplaatsen
- Zichtbaarheid: fluovestje aan te raden
- Oogcontact met chauffeur kraan/vrachtwagen
- Gebruik gezond verstand

AFKOPPELINGEN

AFKOPPELINGEN

- Afkoppelingsdeskundige bezig met bezoeken
- Afkoppelingsdossiers worden overgemaakt
- Uitvoering van de afkoppelingen tegen einde der werken
- Aannemer kent de voorziene locatie voor de aansluitputjes
  - Indien wijzigingen: doorgeven aan aannemer
- Na werken: keuring en premies door afkoppelingsdeskundige

AANDACHTSPUNT

Gescheiden stelsel / infiltratiekolken

Lozen in straatkolk = lozen in gracht / grond

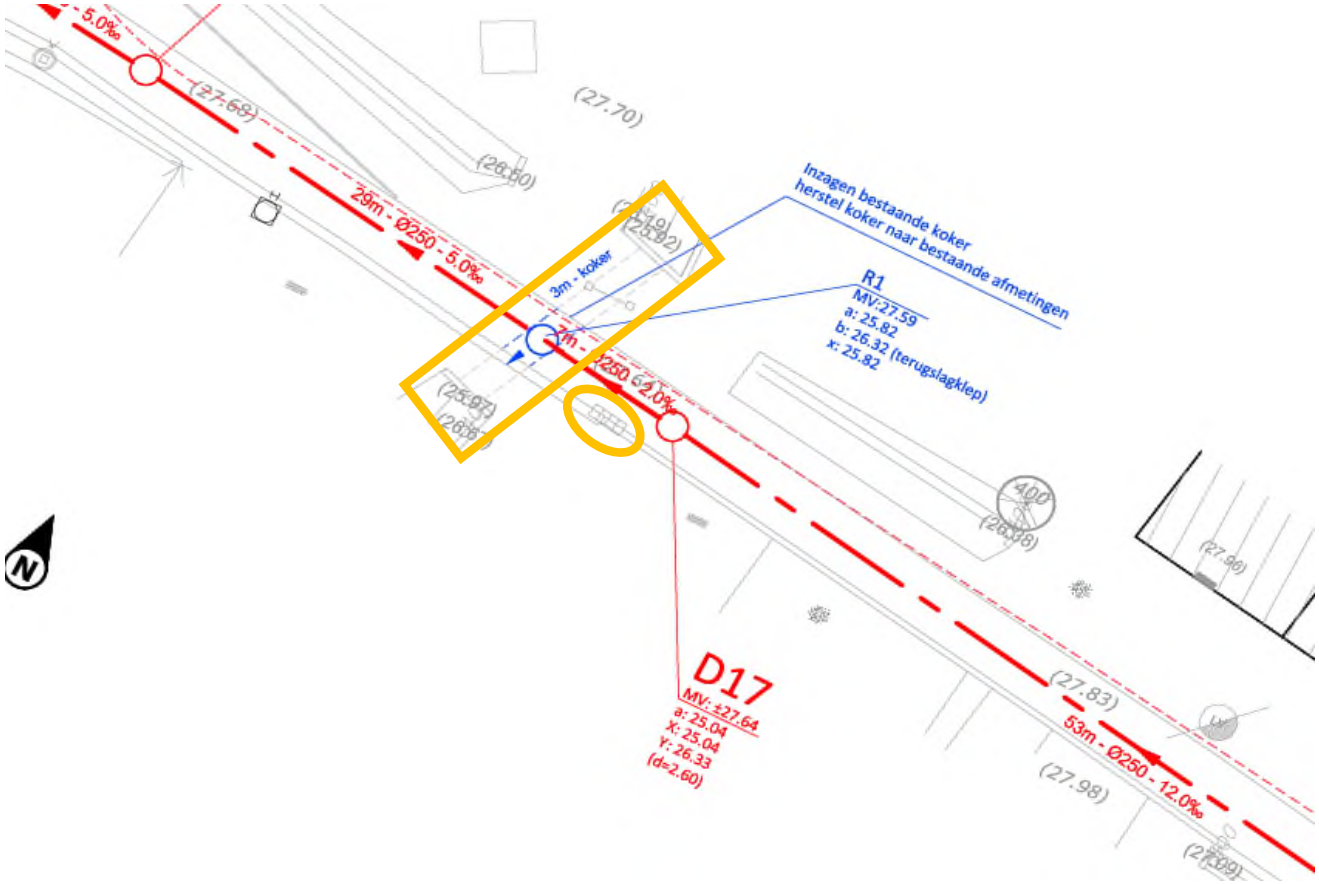

VRAGEN

CONTACT

Gemeente Beerse
xxx

AGBb
xxx

xxx– projectmanager Fluvius
xxx

Afkoppelingsdeskundige
xxx
